



SEPLAN | SEFAZ | CGE | PRODAP

Relatório Resumido da Implantação do Siafe-AP em 2023

Histórico dos sistemas utilizados
pelo GEA nos últimos 26 Anos



Embasado pela Portaria nº 018/2023/SEPLAN que designa os fiscais do Contrato nº 001/2022/SEPLAN Processo: 150101.0077.0734.0002/2023-GAB/SEPLAN com a empresa LOGUS, que tem como objetivo a instalação, implantação, integração, migração de dados, configuração, parametrização, treinamento e cessão de Licença de Uso de uma Solução Tecnológica Unificada de Gestão de Planejamento, Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil que atenda às necessidades e especificidades do Governo do Estado do Amapá, incluindo todos seus poderes constituídos, integrando-se aos demais sistemas corporativos do estado em total consonância com a legislação pertinente.

Resumo da implantação do Siafe-AP 2023

Dando continuidade ao Projeto de Implantação do **Siafe-AP** inicialmente chamado de Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá, que substituiu a partir do exercício de 2020 o sistema **SIPLAG** - Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Atendendo a Decisão Normativa Nº. 024/2023 no artigo Art. 2º inciso §1º do TCE, informando no mínimo, os objetivos e metas definidas para o exercício de 2023, os resultados alcançados ao fim do exercício, assim como as justificativas para objetivos ou metas não atingidos relatamos que:

Objetivos e metas definidas para 2023	Resultados alcançados	Justificativas para objetivos ou metas não atingidos
1 – Readequação do Ambiente de Elaboração do PPA para 2024 atendendo as características do PPA 2024 a 2027 da nova gestão.	Objetivo concluído , readequamos o ambiente do exercício de 2024 para a Elaboração do PPA – Plano Plurianual 2024 a 2027 atendendo as características do Programa de Governo da nova gestão e liberamos para os usuários que elaboraram e concluíram a peça constitucional até a entrega na Assembleia Legislativa do Estado. Importante destaca que foi incluído nos atributos das Ações as 17 ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, permitindo um análise mais alinhado com os classificadores do PPA no âmbito estadual, nacional e internacional.	
2 – Adequamos o ambiente para a Elaboração da LDO	Objetivo concluído , adequamos o ambiente do exercício de 2024 para a Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e liberamos para os usuários que elaboraram e concluíram a peça constitucional até a entrega na Assembleia Legislativa do Estado.	
3 – Adequamos o ambiente para a Elaboração da LOA	Objetivo concluído , adequamos o ambiente do exercício de 2024 para a Elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual e liberamos para os usuários que elaboraram e concluíram a peça constitucional até a entrega na Assembleia Legislativa do Estado.	
4 – Módulo de Emendas Parlamentares Federais no Siafe-AP.	Objetivo em andamento , iniciamos o processo de adequação do Módulo de Emendas do Siafe-AP, o que irá permitir o registro e acompanhamento da execução orçamentária e financeira das Emendas Federais, sejam elas dos Deputados Federais e dos Senadores, incluímos 5 tipos de Emendas 1. Especial RP6 2. Individual por finalidade definida RP6	Apenas aguardando as definições dos procedimentos de competências operacionais e de Gestão metodológica do módulo, para subir em produção.

	3. Bancada RP7 4. Comissão RP8 5. Discricionária RP2							
5- Módulo de Diárias no Siafe-AP.	Objetivo em andamento , atendendo uma demanda da CGE para efeito no portal da transparência, iniciamos o processo de análise da inclusão de atributos de diárias no SIAFE, de forma que possamos ter um cadastro de: 1- Tipo de diária (Internacional/ Nacional/ Local), 2 - Cargo/Função 3 - Período de deslocamento (incluir data ida e data volta) 4 - Local de destino (caixa de seleção de Estados e cidades) 5 - Bloqueio (regra para o bloqueio é a conformidade da baixa das diárias anteriores) 6 - Anexos/ Protocolo Prodoc	Em fase de elaboração do Plano de Trabalho para iniciar o desenvolvimento e implementação em 2024						
6- Implantação do sistema ERGOU e Configuração e Gerenciamento do Módulo de Projetos do Siafe-AP.	Objetivo em andamento , atendendo uma demanda da SEFAZ, iniciamos o processo de Implantação do sistema ERGOU e Configuração e Gerenciamento do Módulo de Projetos do SIAFE, para atender o Controle contábil e Prestação de contas em Dólar e em Real, necessário para a contratação da Operação de Crédito pleiteada pelo Governo do Estado do Amapá junto ao BID, Projeto PROFISCO.	Cronograma de implantação já elaborado aguardando a elaboração do Plano de Trabalho para iniciar a configuração e implementação em 2024						
7- Implantação do SIAFE na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.	Objetivo em andamento , acompanhando as atividades e demandas referente a essa implantação entre os técnicos envolvidos, onde todos os trabalhos realizados estão disponíveis na AP-3716 e 3831 , situação atual é que a equipe da ALAP ainda não retornou com as planilhas de DexPa preenchidas, que é procedimento inicial fundamental para o análise das especificidades das configurações específicas da ALAP. Implantação do SIAFE - AP - AL <table><caption>Implantação do SIAFE - AP - AL</caption><tr><th>Status</th><th>Porcentagem</th></tr><tr><td>Concluido</td><td>70%</td></tr><tr><td>Falta concluir</td><td>30%</td></tr></table>	Status	Porcentagem	Concluido	70%	Falta concluir	30%	Registro do dia 28/11/2023 feito pelo servidor da ALAP Franklin Augusto Amaral de Mendonça retoma as atividades de implantação, solicitando que seja encaminhado novamente as planilhas para preenchimento. Retorno feito pelo Bruno Chaves da LOGUS (empresa responsável pela Implantação em apoio ao GEA), envia novamente todos os documentos que haviam sido enviados no dia 01/12/2022, informar ainda que não tivemos mais retorno do trabalho que estava sendo feito no final de 2022 e início de 2023. Desde então todos os trabalhos relacionados a essa atividade estavam paralisados. Até o momento não tivemos retorno.
Status	Porcentagem							
Concluido	70%							
Falta concluir	30%							

8. Implantação do SIAFE no Ministério Público do Estado do Amapá.	Objetivo não concluído (parado), continuamos no mesmo status do ano anterior. a opção definida pelo MP através do ofício Ofício Nº 0000054/2022-SG/PGJ DE 24/05/2022, de integrar os sistemas SIAFE com o e-Cidades entre os módulos de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, o que não aparece como uma opção no Decreto Federal nº 10.540, No caput do Decreto Federal nº 10.540 “ Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle.” E no § 6º “§ 6º O Siafic será único para cada ente federativo e permitirá a integração com outros sistemas estruturantes, conforme o disposto nos incisos I e II do caput do art. 2º, vedada a existência de mais de um Siafic no mesmo ente federativo, mesmo que estes permitam a comunicação, entre si, por intermédio de transmissão de dados.” Desta forma desconhecemos o cenário de integração entre dois Siafic's no mesmo ente da federação. Implantação do SIAFE - AP - MP	Informamos que considerando as exigências do Decreto Federal nº 10.540, que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, o MINISTÉRIO PÚBLICO - MP formalizou o interesse de utilizar o SIAFE/AP de forma “integrada com o Sistema e-Cidade” pelo Ofício Nº 0000054/2022-SG/PGJ DE 24/05/2022, considerando o convite do Tribunal de Contas do Estado - TCE-AP, por meio do Ofício nº 014/2022 – 2ª ICE/TCE-AP, para a participação de técnicos do Órgão Ministerial em Reunião sobre o SIAFIC, ocorrida em 02/05/2022, tendo como pauta as tratativas quanto à implantação do Sistema Único de Gestão e suas Implicações, sendo designados os servidores Elionai Dias da Paixão e Marcelo Magalhães Pantoja para acompanhar o processo. • Área Contábil: Max Ferreira Barbosa • Tecnologia da Informação: Marcelo Magalhães Pantoja
---	---	---


9.

Implantação
do SIAFE na
AMPREV.

Objetivo não concluído (parado), continuamos no mesmo status do ano anterior.

Implantação do SIAFE - AP – AMPREV

Os trabalhos não avançaram de forma objetiva, apesar de todos os esforços das equipes envolvidas, evidenciado nas atividades registradas no Jira AP-3385 (sistema de acompanhamento de projeto) tais como Análise do Plano de Contas, Análise dos Balancetes, construção do DE/PARA Contábil das contas a serem transferidas para o SIAFE-AP, onde foi observado, contas conter o necessário de 11 elementos nas máscaras contábeis da AMPREV e o SIAFE conter 8.

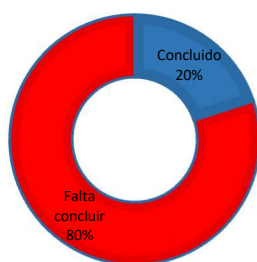


No dia 09 de novembro em reunião convocada pela AMPREV em sua sede com a presença da equipe da Empresa Agenda que presta serviço de suporte ao sistema atual da AMPREV e a equipe da SEFAZ e SEPLAN, como pauta “verificar as pendências no processo de integração da AMPREV ao sistema SIAFE” como registrado no jira AP-3453.

Informamos que considerando as exigências do Decreto Federal nº 10.540, que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, não contem a possibilidade de integração entre dos SIAFIC’S no mesmo ente da federação, e sim a possibilidade de integração entre sistemas estruturantes. Ficando assim as equipes da SEFAZ e AMPREV de participar da reunião do GEFIN no dia 26 de novembro de 2022 para aproveitar o tema de assuntos livres e interagir com outros Estados da Federação a forma que estão adotando as Previdências com relação ao atendimento do Decreto Federal nº 10.540.

10 Integração do SIAFE com SIGA	Objetivo não concluído (parado), continuamos no mesmo status do ano anterior. até a presente data não tivemos retorno do OFÍCIO CIRCULAR Nº 150101.0079.0531.0021/2021 GABINETE – SEPLAN, Dando continuidade a implantação do projeto SIAFE-AP, encaminhado aos colaboradores indicados pela SEAD, SEFAZ, PGE, CGE, PRODAP, SEPLAN através do OFÍCIO CIRCULAR Nº 150101.0009.0531.0005/2020 SEPLAN e suas equipes, construíram em conjunto com as empresas LOGUS e AZ prestadoras de serviços de suporte nos sistemas SIAFE-AP e SIGA, cinco (05) fluxogramas de integração entre os sistemas nos módulos Compras e Licitação, Contrato, Almoxarifado e Patrimônio. Desta forma encaminhamos em anexo os citados fluxos para conhecimento e as devidas providencias de tratativas de implementações por parte da empresa AZ prestadora de serviço de suporte ao sistema SIGA. Importante informar que da parte do sistema SIAFE as implementações já foram oficializadas pela SEPLAN para a empresa LOGUS e já estão em desenvolvimento apenas aguardando o retorno do desenvolvimento por parte da AZ com relação ao SIGA.	Reiterado através do OFÍCIO Nº 150101.0077.0729.0052/2022 SIPLAG – SEPLAN em atenção ao PRODAP por ser o gestor do contrato junto a referida empresa AZ e até a presente data não tivemos retorno.
---	---	---

Objetivos e Metas definidas para Implantação do SIAFE EM 2023 e resultados alcançados

Total de objetivos e metas	10
Concluído	3
Não concluído (parado)	3
Em andamento	4

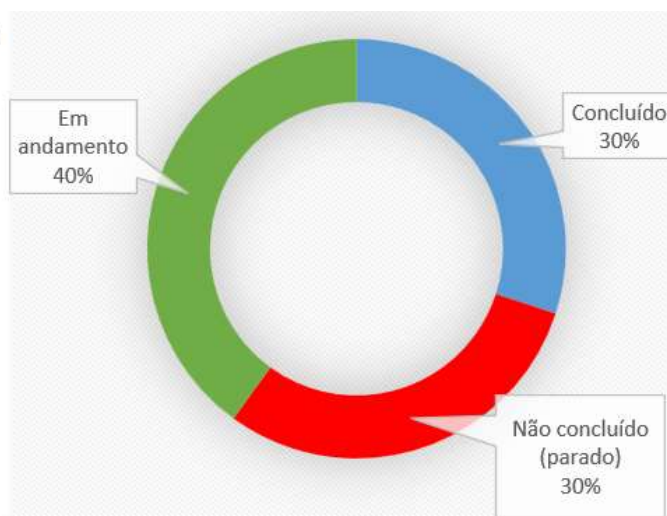

Um Resumo dos Projetos a serem implantados em 2024:

- ✓ **1- Implantar o SIAFE na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.**
- ✓ **2- Implantar o SIAFE na AMPREV.**
- ✓ **3- Implantar o SIAFE no Ministério Público do Estado do Amapá e possíveis integrações com seus sistemas estruturantes.**
- ✓ **5- Ampliar a integração do SIAFE com SIGRH – nas folhas de pagamento específica das outras Unidades Gestoras com exceção da SEAD que já foi integrada.**
- ✓ **6- Integração do SIAFE com SIGA**
 - Implantação em andamento subdividido nos módulos de:
 - Compras e Licitação
 - Contrato
 - Almoxarifado
 - Patrimônio (Mobiliário e Imobiliário)
- ✓ **7- Implantar o sistema ERGOU e Configuração e Gerenciamento do Módulo de Projetos do Siafe-AP, para atender o Controle contábil e Prestação de contas em Dólar e em Real, necessário para a contratação da Operação de Crédito pleiteada pelo GEA junto ao BID, Projeto PROFISCO;**
- ✓ **8 - Concluir a implantação do Módulo de Emendas Parlamentares Federais no Siafe-AP**
- ✓ **9 - Iniciar a implantação do Módulo de Diárias no Siafe-AP**
- ✓ **Ampliar a integração do SATE com o SIAFE na automação do IPVA.**

Atualizado até dezembro de 2023




Visão do Planejamento Estratégico do Projeto Siafe-AP

Compromisso com:

- ✓ A População
- ✓ A Transparência
- ✓ O Governo Federal
- ✓ Os Órgãos de Controle Interno e Externo

Compromisso com a Gestão Estadual

Acompanhamento e Avaliação dos Programas e Ações de Governo

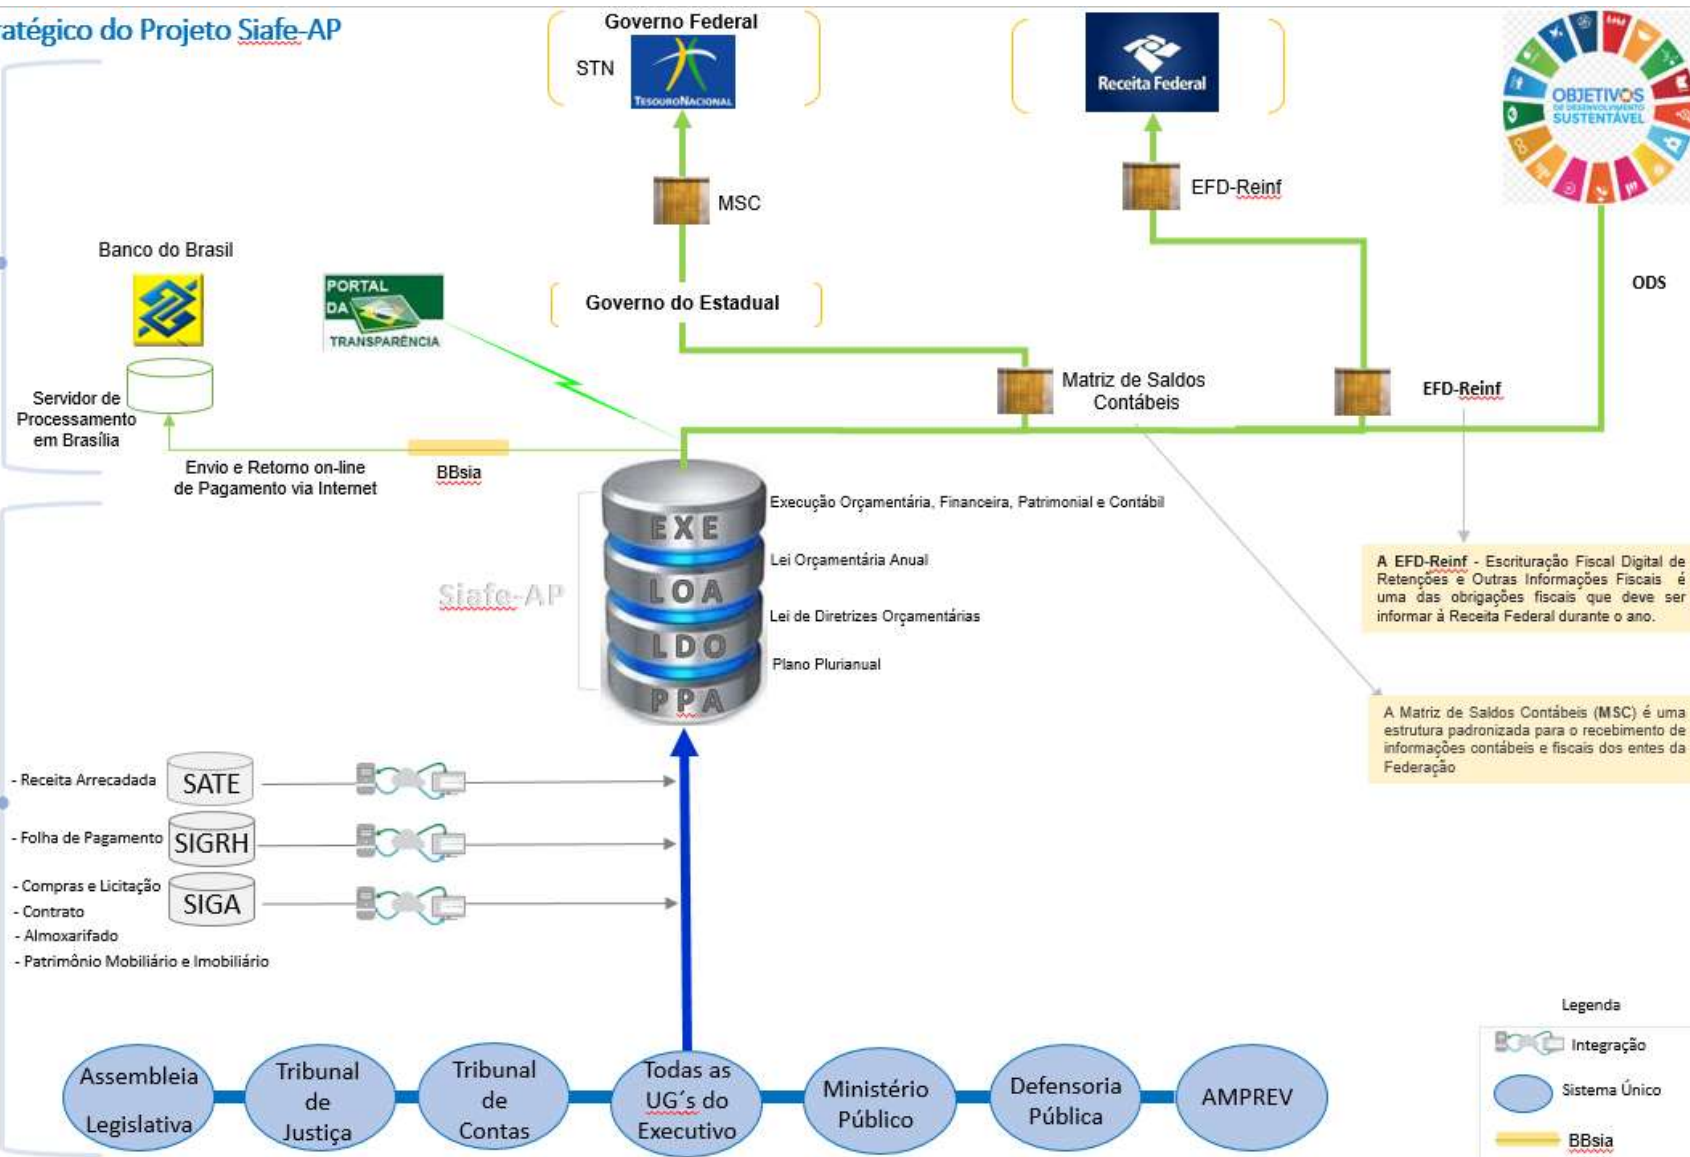

Fiscais do Contrato:

A portaria nº018/2023/SEPLAN, que designa os servidores Sileno Silva dos Santos - SEPLAN, Kátia da Silva Loureiro do Nascimento -SEPLAN e Rosa de Almeida Guterres – SEFAZ para atuarem como fiscais do contrato 001/2022 SEPLAN dos serviços da Empresa LOGUS com objetivo de implantar e manter o sistema SIAFE no ente da federação Governo do Estado do Amapá.

Crédito aos Órgãos condutores desta implantação do SIAFE-AP:

- 1- Secretária de Estado do Planejamento - SEPLAN
- 2- Secretária de Estado da Fazenda - SEFAZ
- 3- Controladoria Geral do Estado - CGE
- 4- Centro de Gestão da Tecnologia da Informação -PRODAP

